

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目 绩效评价报告

主管部门：垣曲县教育局

实施单位：垣曲县城北初级中学

委托单位：垣曲县财政局

评价机构：山西高盛新会计师事务所有限公司

主 评 人：程海潮

2023年12月31日

目 录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	6
(一) 项目概况.....	6
(二) 项目绩效目标.....	9
二、绩效评价工作情况.....	10
(一) 绩效评价目的和依据.....	10
(二) 评价原则.....	11
(三) 绩效评价指标体系.....	11
(四) 评价方法.....	13
(五) 绩效评价工作组及人员分工.....	13
(六) 绩效评价工作过程.....	14
三、评价结论及绩效评价指标分析.....	16
(一) 评价结论.....	16
(二) 绩效评价指标分析.....	17
四、存在的问题及建议.....	29
附件 1 财政支出项目绩效评价指标体系.....	31
附件 2 社会调查问卷汇总分析报告.....	37
附件 3 项目自评报告的评价.....	44
附件 4 访谈报告.....	46
附件 5 合规性检查报告.....	49
附件 6 现场照片.....	51

摘 要

一、项目立项背景

为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《教育信息化2.0行动计划》，推进教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，形成支撑和引领教育现代化的新途径和新模式，打造纵向衔接、横向贯通，全方位、多层次、立体化的教育新格局，构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系，促进教育公平、提高教育质量，推动智慧教育整体水平走在全国前列。

为全面提高垣曲县教育信息化水平，根据教育部《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）、《网络学习空间建设与应用指南》（教技〔2018〕4号）、《中小学数字校园规范（试行）》（教技〔2018〕5号）、《运城市智慧教育二期工程建设实施方案》（运政智〔2019〕1号）等文件精神，决定实施垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目，改善学校教育信息化基础设施，优化教育教学环境，满足基本教学办学需求，深入推进信息技术深度应用，大力提高学校教育现代化水平。

二、项目实施内容及资金情况

1、项目实施内容

项目建设内容包括：校园广播、安防监控、校园网络、班班通设备、智慧书法教室、智慧阅览室、计算机教室、精品录播、创客教室、常态录播等建设工作。

主要设备及系统包括：IP网络广播系统主机、IP网络广播主控软件、网络广播移动分控软件、广播管理系统主机、监听网络解码音箱、

网络寻呼话筒、控制电脑、核心交换机、广播机柜、纯后级定压功率放大器(插卡式)、无线手持话筒、全彩筒型摄像机、半球摄像机、8口 POE 交换机、16 口 POE 交换机、24 口 POE 交换机、64 路硬盘录像机、吸顶 AP、户外 AP、教学设备、OLT、交互式数字临摹台、学生互动拍摄系统、书法临摹桌、书法教学直播系统、书法教学查询系统、书法集创系统、书画教学展示台等。

2、项目资金情况

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目总投资 743.06 万元，项目资金由垣曲县财政统筹解决。

截止 2023 年 12 月 31 日，该项目已使用财政资金 743.06 万元，资金已全部支付，用于购置校园网络、安防监控、校园广播以及 41 间教室信息化教学设备。

三、评价思路

本次绩效评价工作基准日为 2023 年 12 月 31 日，评价组通过资料收集、现场调查、统计分析、数据核查等，查阅项目实施方案、预算评审、招投标、合同、财务等资料，了解项目实施和资金使用情况。对项目设备安装完工情况及综合使用情况等进行实地勘察，就项目实施后对促进学校教育教学、推动学校信息化教育等方面所起的作用与教职工、学生等进行沟通交流，结合绩效评价指标，对所核实的内容进行整理汇总、审查和分析，在此基础上对该项目作出整体评价。

四、评价结论

经项目组评价，本项目总体得分为 91.90 分，绩效评价等级为优。

项目绩效评价得分表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	20	28	22	30	100
分值	17	26	20	28.9	91.90
得分 (%)	85	92.86	90.91	96.33	91.90

五、存在的问题及建议

(一) 垣曲县城北初级中学绩效管理工作不到位，绩效指标不准确、不具体，可衡量性不强，自评报告内容描述不完整，具体为：

1. 个别指标设置的指标内容及指标值不准确、不全面。如数量指标为：校园网络覆盖率达到 100%，安防监控覆盖率达到 100%，各功能室投入使用率为 100%。其中“各功能室投入使用率为 100%”应为质量指标，同时数量指标中也未具体描述设备购置数量，数量指标不准确、不全面，无法准确反映项目建设内容。

2. 自评报告未对项目资金使用情况进行描述，未对项目绩效目标的完成及评价情况进行认真分析。

建议：垣曲县城北初级中学要加强绩效管理工作，完善预算绩效管理体系，把绩效目标作为编制预算不可或缺的有机内容。根据项目具体实施情况制定切实可行的绩效目标，总体目标要贴近实际、符合项目特点，具体目标要充分考虑项目特点，合理制定项目产出、质量、时效性、经济效益、社会效益等目标，并以历史数据、行业标准及资金规模为依据，制定合理的绩效指标，年度终了及时开展项目自评，自评报告真实完整，便于财政部门通过绩效目标管理系统对项目进行绩效监督及管理工作。

(二) 垣曲县城北初级中学未根据项目特点制定项目后续管理制度，项目缺乏制度制约，制度管理意识有待加强。

建议：项目单位应强化制度保障，结合项目具体情况制定项目后续管护制度，重视对购置设备的后期保养和维修管护，有效保障设备长期稳定运行。

（三）项目单位未按照合同规定时间完成建设任务，工期有所延长，影响智慧教育项目早日投入使用。

根据合同规定，运城市锐志电子科技有限公司应在合同签订后30天内供货，合同签订日期为2022年9月11日，实际于2022年12月9日完成智慧教育项目全部供货内容，项目推迟将近两个月。

建议：项目单位需重视工程监督考核工作，高度重视项目推进工作，倒排工期、督促设备供给方及早进行设备安装，在保证质量的前提下尽早完成安装。工程建设过程中发现问题及时汇报，及时处理，确保项目早完工、早使用。

评价机构：山西高盛新会计师事务所有限公司

主评人：

绩效评价报告

我们接受垣曲县财政局委托，于2023年12月8日至2023年12月31日对垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目资金进行了绩效评价。本次绩效评价工作基准日为2023年12月31日，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》等文件的精神和相关要求，我们按照绩效评价工作方案确定了评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成了本报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目立项背景和目的

（1）项目立项背景

为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《教育信息化2.0行动计划》，推进教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，形成支撑和引领教育现代化的新途径和新模式，打造纵向衔接、横向贯通，全方位、多层次、立体化的教育新格局，构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系，促进教育公平、提高教育质量，推动智慧教育整体水平走在全国前列。

为全面提高垣曲县教育信息化水平，根据教育部《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）、《网络学习空间建设与应用指南》（教技〔2018〕4号）、《中小学数字校园规范（试行）》（教技〔2018〕5号）、《运城市智慧教育二期工程建设实施方案》（运政智〔2019〕1号）等文件精神，决定实施垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目，改善学校教育信息化基础设施，优化教育教学环境，

满足基本教学办学需求，深入推进信息技术深度应用，大力提高学校教育现代化水平。

（2）项目立项目的

通过项目实施，形成与垣曲县教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，推动信息技术与教育教学的深度融合，促进教育结构的优化、教育公平的实现和教育质量的提高，力争使垣曲县教育信息化发展水平进入全市先进行列。

2、项目资金来源及使用情况

（1）项目资金来源

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目总投资 743.06 万元，项目资金由垣曲县财政统筹解决。

（2）项目资金使用情况

截止绩效评价基准日，该项目已使用财政资金 743.06 万元，资金已全部支付，用于购置校园网络、安防监控、校园广播以及 41 间教室信息化教学设备。

3、利益相关方

本次项目涉及的利益相关方包括：

- （1）财政拨款部门：垣曲县财政局；
- （2）项目主管部门：垣曲县教育局；
- （3）项目实施单位：垣曲县城北初级中学；
- （4）项目受益群体：垣曲县城北初级中学全体教职工及学生。

4、项目组织实施情况

（1）项目组织情况

项目相关部门及工作职责：

财政部门：垣曲县财政局负责审批、拨付预算资金，组织开展绩效评价工作等；

主管部门：垣曲县教育局负责审核项目立项、资金申报，对项目的实施进行指导、监督；

实施部门：垣曲县城北初级中学负责项目的具体实施，按照绩效目标使用财政资金，开展绩效自评工作等；

受益群体：垣曲县城北初级中学全体教职工及学生。

（3）项目实施情况

①项目前期工作

垣曲县财政投资评审中心委托山西长翔工程造价咨询有限公司对垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目预算进行评审，审定后项目总投资746.23万元。

垣曲县城北初级中学委托山西金娣招标代理有限公司进行公开招标，中标单位为运城市锐志电子科技有限公司，中标价743.87万元。

2022年9月11日，项目单位与运城市锐志电子科技有限公司签订项目合同，合同金额743.87万元；2022年12月12日，双方签订补充合同，合同金额核减0.81万元，最终确定投资额743.06万元。

②项目实施内容

项目建设内容包括：校园广播、安防监控、校园网络、班班通设备、智慧书法教室、智慧阅览室、计算机教室、精品录播、创客教室、常态录播等建设工作。

项目主要设备及系统包括：购置安装IP网络广播系统主机、IP网络广播主控软件、网络广播移动分控软件、广播管理系统主机、监听网络解码音箱、网络寻呼话筒、控制电脑、核心交换机、广播机柜、

纯后级定压功率放大器(插卡式)、无线手持话筒、全彩筒型摄像机、半球摄像机、8口POE交换机、16口POE交换机、24口POE交换机、64路硬盘录像机、吸顶AP、户外AP、教学设备、OLT、交互式数字临摹台、学生互动拍摄系统、书法临摹桌、书法教学直播系统、书法教学查询系统、书法集创系统、书画教学展示台等。

(二) 项目绩效目标

项目单位根据项目特点,编制相应绩效目标并向财政部门进行申报,绩效目标主要内容如下:

1. 总体目标

形成与我校教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系,高速互联的基础网络普及完善,资源平台和管理平台功能齐全,智能、安全的信息技术应用环境全面建成。依托智能平台技术,推动信息技术与教育教学的深度融合,促进教育结构的优化、教育公平的实现和教育质量的提高。

2. 项目分解指标

(1) 产出指标

数量指标:校园网络覆盖率100%,安防监控覆盖率100%,各功能室投入使用率100%;

质量指标:设备质量合格率100%;

时效指标:智慧校园建设期 \leq 1年;

成本指标:校园网络系统 \leq 100万,安防广播系统 \leq 200万,各功能室及设备 \leq 443.06万;

(2) 效益指标

社会效益指标:学生长期受到教育;

可持续影响指标：智慧校园项目 ≥ 8 年；

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：师生满意度 $\geq 93\%$ 。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的和依据

财政支出绩效评价旨在改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。本项目绩效评价是根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目财政资金使用情况、财务管理状况进行核实；同时核实项目单位为加强管理所制定的相关制度、采取的措施是否得到有效执行等；评价绩效目标预定产出和效益的实现程度，总结项目实施的经验和主要做法，查找项目实施过程中存在的问题，对以后年度项目资金安排和监管提出建议。

本次项目评价所依据的法律、法规规章、政策文件，包括但不限于：

1、绩效评价依据：

(1) 《中华人民共和国预算法》2018年第二次修正

(2) 《中华人民共和国预算法实施条例》中华人民共和国国务院令 第729号

(3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4) 《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）

(5) 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财

预〔2020〕10号)

(6) 财政部关于印发《第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法》的通知(财监〔2021〕4号)

2、政策评价依据

(1) 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》

(2) 《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》

(3) 《教育信息化“十三五”规划》

(4) 《教育信息化2.0行动计划》

(5) 运城市智慧教育建设领导小组关于印发《运城市创建“国家智慧教育示范区”实施方案》的通知(运政智〔2019〕2号)

(6) 垣曲县教育科技局关于印发《垣曲县智慧教育二期工程建设实施方案》的通知(垣教发〔2019〕12号)

(7) 项目预算评审报告、合同、财务收支情况等相关资料

(8) 其他有关的法律、法规、规章及政策文件

(二) 评价原则

1. 独立原则。在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2. 客观原则。按照协议(合同)约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价, 不出具不实预算绩效评价报告。

3. 规范原则。履行必要评价程序, 合理选取具有代表性的样本, 对原始资料进行必要的核查验证, 形成结论并出具预算绩效评价报告。

(三) 绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)文件精神, 遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则,

形成了垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目资金的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从决策到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、满意度共12个二级指标以及立项程序规范性、绩效目标合理性、资金分配合理性、财政资金到位率、资金使用合规性、制度执行有效性、校园广播及网络安装服务完成情况、项目验收有效性、项目完工及时性、未来教学发展需求性等31个三级指标，具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准分值
决策 (A)(20%)	项目立项 (A1) (4%)	立项依据充分性 (A1-1)	2
		立项程序规范性 (A1-2)	2
	绩效目标 (A2) (8%)	绩效目标合理性 (A2-1)	4
		绩效指标明确性 (A2-2)	4
	资金投入 (A3) (8%)	预算编制科学性 (A3-1)	4
		资金分配合理性 (A3-2)	4
过程 (B)(28%)	资金管理 (B1) (8%)	财政资金到位率 (B1-1)	2
		预算执行率 (B1-2)	2
		资金使用合规性 (B1-3)	4
	组织实施 (B2) (20%)	管理制度健全性 (B2-2)	6
		制度执行有效性 (B2-3)	6
		财政预算评审	4
		招投标制度执行情况	2
		工程监理情况	2
产出 (C)(30%)	产出数量 (C1) (7%)	校园广播及网络安装服务完成情况 (C1-1)	1
		校园安防监控安装服务完成情况 (C1-2)	1
		智慧教室设备安装服务完成情况 (C1-3)	1
		计算机教室设备安装服务完成情况 (C1-4)	1
		创客教室设备安装服务完成情况 (C1-5)	1

一级指标	二级指标	三级指标	标准 分值
		录播设备安装服务完成情况 (C1-6)	1
		班班通设备安装服务完成情况 (C1-7)	1
	产出质量 (C2) (12%)	项目验收有效性 (C2-1)	4
	产出时效 (C3) (6%)	项目完工及时性 (C3-1)	6
	产出成本 (C4) (5%)	成本可控性 (C4-1)	5
效益 (D) (30%)	社会效益 (D1) (12%)	提升教学学习能力和效率 (D1-1)	6
		促进基础教育均衡化发展 (D1-2)	6
	可持续影响 (D2) (6%)	未来教学发展需求性 (D2-1)	6
	满意度 (D3) (12%)	学生满意度 (D3-1)	6
		教职工满意度 (D3-2)	6

(四) 评价方法

在评价工作开展过程中运用的方法主要有：

1、比较分析法

项目组通过实地走访项目实施单位，详细了解项目的具体情况，并依据了解到的情况和取得的项目文件对该项目作出评分。项目组在评分过程中，通过比较绩效目标与实施效果，确定项目绩效目标的实现情况。

2、公众评判法

项目组通过对受益对象发放调查问卷的方式，获取受益对象对项目满意度的评价资料，从而对该项目的满意度进行评价。

3、因素分析法

项目组通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(五) 绩效评价项目组及人员分工

项目组分为领导组和工作组。领导组主要负责评价方案的制定，评价人员的组织培训、实施过程的组织协调和督导、报告的复核等。

具体人员及分工见下表：

项目	姓名	职务	职称	职责分工
组长	李建岭	事务所所长	注册会计师	负责统筹协调，对主要绩效评价指标及评价情况进行复核
副组长	杨霞	事务所副所长	注册会计师、注册评估师	负责绩效评价项目的组织实施、报告复核，对绩效评价工作质量负责

工作组主要负责现场检查及报告编写，包括收集相关的制度文件、检查财务资料，开展问卷调查等工作。具体人员及分工见下表：

项目	姓名	资格	职称	职责分工
主评人	程海潮	项目经理	注册会计师	负责绩效评价方案、报告初步编写、指导助理人员完成绩效评价工作
成员	史阳军	助理人员	注册会计师	协助现场负责人开展工作
成员	王飞	助理人员	中级会计师	绩效评价资料收集整理、分析
成员	常茸晶	助理人员	初级会计师	负责社会调查、资料收集及核实

（六）绩效评价工作过程

本次绩效评价实施过程分为绩效评价前期准备、现场实施、绩效评价报告撰写和提交四个阶段。绩效评价工作于2023年12月8日开始，前期通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制绩效评价工作方案。在此基础上，通过实施下列工作流程，完成评价工作：

1、前期准备阶段（2023年12月8日-12月10日）

本所接受垣曲县财政局的委托，签订绩效评价业务约定书，成立了由主任会计师李建岭担任项目负责人的绩效评价工作组。工作组对参与此次绩效评价的工作人员进行了相关知识的学习和业务培训，召

开了绩效评价工作会议，明确了此次绩效评价的基本事项，包括：项目基本情况、项目绩效目标；绩效评价的对象和内容；绩效评价的目的；委托方及绩效评价报告使用者和其他重要事项等。最后工作组通过审阅有关项目资料、进行访谈等方式搜集整理资料，编制了针对本项目的绩效评价工作方案，确定了评价指标体系与实施流程。

2、绩效评价现场实施阶段（2023年12月11日-12月14日）

根据项目特点，按照绩效评价方案，通过案卷审阅、访谈、实地复核、现场勘查、座谈会等方法收集相关评价数据，对相关文件、资料、财务数据进行甄别、汇总、分析，结合绩效评价指标、权重、标准和方法进行定量定性分析和综合评价，形成评价结论。运用定量与定性结合的方法确定分值。具体工作包括：

（1）数据采集

工作组按照计划搜集垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目立项审批、资金使用等相关的基础数据资料，并对其进行分类整理汇总、审查和分析。

（2）现场工作

在项目单位的配合下，根据所搜集的数据资料，开展现场核实工作。首先查阅项目的相关管理制度、招投标资料、采购合同及设备验收等资料，其次对智慧教育建设项目采购数量和质量进行评价；与城北初级中学教职工及学生进行沟通交流，了解项目实施对促进学校教育教学、推动学校信息化教育等方面所起的作用，获取项目受益对象对项目实施的评价信息。

（3）社会调查

工作组根据项目绩效评价思路和项目单位具体情况，设计调查问

卷。工作组根据调查问卷的反馈结果进行统计分析，作为确定项目群众满意度的主要依据。

（4）数据统计分析

工作组根据绩效评价的原理和规定，结合项目的具体情况，根据被评价单位提供的数据和社会调查结果，对数据进行分析处理。比照绩效评价指标体系计分的标准，得出相应的分值，分析得失分的原因。

3、绩效评价报告撰写和提交阶段（2023年12月15日-2023年12月31日）

（1）根据各指标的评价结果及项目的整体评价结论，按绩效评价相关规定和绩效管理部门的要求撰写绩效评价报告；

（2）与被评价方就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；

（3）履行会计师事务所内部三级复核程序；

（4）提交绩效评价正式报告。

三、评价结论及绩效评价指标分析

（一）评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级的方法，总分值为100分。绩效评级分“优”、“良”、“中”、“差”。最终绩效评价结果按照综合评分分级：综合评分90（含）-100分的为“优”，80（含）-90分的为“良”，60（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。

项目组按照本项目绩效评价工作方案确定的绩效评价指标、评价标准和评价方法，在对评价对象的绩效情况进行定量和定性分析的基础上，经综合评价，本项目得分为91.90分，绩效评价等级为优。其中：决策类指标权重为20分，得分为17分，得分率为85%；过程类指标权重为28分，得分为26分，得分率为92.86%；产出类指标权

重为 22 分，得分为 20 分，得分率为 90.91%；效益类指标权重为 30 分，得分为 28.90 分，得分率为 96.33%。

表 3-1 项目绩效评价得分表

指标	A 项目决策	B 项目过程	C 项目产出	D 项目效益	合计
权重	20	28	22	30	100
分值	17	26	20	28.9	91.90
得分 (%)	85.00	92.86	90.91	96.33	91.90

(二) 绩效评价指标分析

1. 决策类指标

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个方面对项目的决策情况进行评价，决策类指标分值 20 分，实际得分 17 分，得分率 85%。

具体得分情况如下表所示：

表 3-2 项目决策类指标得分情况

二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率(%)
项目立项	A1-1 立项依据充分性	2	2	100
	A1-2 立项程序规范性	2	2	100
绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	4	4	100
	A2-2 绩效指标明确性	4	1	25
资金投入	A3-1 预算编制科学性	4	4	100
	A3-2 资金分配合理性	4	4	100

A1-1 立项依据充分性

项目立项依据：

《教育信息化 2.0 行动计划》

运城市智慧教育建设领导小组关于印发《运城市创建“国家智慧教育示范区”实施方案》的通知（运政智〔2019〕2号）

垣曲县教育科技局关于印发《垣曲县智慧教育二期工程建设实施方案》的通知（垣教发〔2019〕12号）

上述文件对教育信息化提出具体要求，建设覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系，促进优质教育资源普及共享，推进信息技术与教育教学深度融合，实现教育思想、理念、方法和手段全方位创新，从而提高教育质量、促进教育公平、构建学习型社会和人力资源强国。

综上所述，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持的范围；未与相关部门同类项目重复。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率100%。

A1-2 立项程序规范性

经评价组核实，项目立项较为规范，申请材料齐全、按规定履行相关审批程序，具体为：

2022年5月垣曲县财政投资评审中心委托山西长翔工程造价咨询有限公司对垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目进行预算评审，并出具评审报告，确定项目送审金额851.51万元，审定金额746.23万元，审减金额105.29万元。最后依据预算评审金额进行政府采购。

满分2分，根据绩效评价指标，本指标得分2分，得分率100%。

A2-1 绩效目标合理性

经核实，项目单位设置的绩效目标为：“形成与我校教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，高速互联的基础网络普及完善，

资源平台和管理平台功能齐全，智能、安全的信息技术应用环境全面建成。依托智能平台技术，推动信息技术与教育教学的深度融合，促进教育结构的优化、教育公平的实现和教育质量的提高。”的目标，项目绩效目标设置合理，与实际工作内容密切相关，预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

A2-2 绩效指标明确性

经评价组核实，项目单位将项目绩效目标细化为数量、质量、时效、成本、效益等目标，但设置的指标内容及指标值不准确、不全面，无法准确反映项目建设内容。如数量指标为：校园网络覆盖率达到 100%，安防监控覆盖率达到 100%，各功能室投入使用率为 100%。其中“各功能室投入使用率为 100%”应为质量指标，同时数量指标中也未具体描述设备购置数量，数量指标不准确、不全面。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 25%。

A3-1 预算编制科学性

经评价组核实，项目单位以预算评审报告作为预算编制基础，评审后项目总投资 746.23 万元，项目建设内容如下：

序号	项目名称	预算金额（元）
1	校园广播	393,030.00
2	安防监控	639,180.00
3	校园网络	735,535.00
4	班班通设备	1,301,167.00
5	智慧书法教室	603,740.00
6	智慧阅览室	185,800.00
7	计算机教室	1,036,640.00
8	精品录播	342,900.00
9	创客教室	512,400.00
10	常态录播	1,711,900.00
合计		7,462,292.00

预算内容与项目内容相匹配，预算编制较为科学、额度测算依据充分，项目预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

A3-2 资金分配合理性

经评价组核实，垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目资金分配依据充分、与项目实际相适应，以财政预算评审中心确定的投资额作为资金分配依据，资金分配较为合理。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

2. 过程类指标

过程类指标从财政资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、财政预算评审、招投标制度执行情况、工程监理情况 8 个方面对项目的过程情况进行评价，过程类指标分值 28 分，实际得分 26 分，得分率 92.86%。

具体得分情况如下表所示：

表 3-3 项目过程类指标得分情况

二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率(%)
资金管理	B1-1 财政资金到位率	2	2	100
	B1-2 预算执行率	2	2	100
	B1-3 资金使用合规性	4	4	100
组织实施	B2-1 管理制度健全性	6	4	66.67
	B2-2 制度执行有效性	6	6	100
	B2-3 财政预算评审	4	4	100
	B2-4 招投标制度执行情况	2	2	100
	B2-3 工程监理情况	2	2	100

B1-1 财政资金到位率

经评价组核实，垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目，垣曲县财政局共安排预算资金 743.06 万元，经核实，财政资金已全部拨付到位，资金到位率 100%。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得 2 分，得分率 100%。

B1-2 预算执行率

经评价组核实，垣曲县城北初级中学截止绩效评价基准日实际支出 743.06 万元，预算执行率为 100%，全部用于支付垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目建设费，支付对象为运城市锐志电子科技有限公司。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得 2 分，得分率 100%。

B1-3 资金使用合规性

经评价组核实，通过检查相关支出凭证，项目资金专款专用，资金使用符合预算批复用途，审批手续完整，资金使用符合财务管理制度及有关专项资金管理办法，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。如：支付款项时，附银行转账单、相关发票、中标通知书、合同、项目验收单等作为付款依据。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

B2-1 管理制度健全性

经评价组核实，垣曲县城北初级中学制定了设施设备使用维修制度、固定资产管理制度、档案管理制度以及财物预算结算制度《上报、审批、签字、工程计划》，但未制定项目后续管理制度，项目缺乏制度制约，制度管理意识有待加强，且智慧教育管理缺乏具体的、操作性较强的管理制度。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 66.67%。

B2-2 制度执行有效性

经评价组核实，项目的实施方案、中标、工程监理、财政预算评审、验收等资料基本完整并及时归档。为保障项目顺利实施，根据以往工作经验及流程开展工作，安排专人负责该项目实施。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

B2-3 财政预算评审

经评价组核实，项目单位严格按照规定对财政投资建设项目履行财政评审手续。垣曲县财政投资评审中心委托山西长翔工程造价咨询有限公司对该项目进行预算评审，项目送审金额 851.51 万元，审减金额 105.29 万元，审定金额 746.23 万元。审减原因主要为：录制面板送审为 1200 元/个，评审调整为 900 元/个；校园教学视频资源管理平台送审为 28000 元/台，评审调整为 25000 元/台；资源平台主机送审为 30000 元/台，评审调整为 27000 元/台；电脑送审为 5000 元/台，评审调整为 4200 元/台等。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

B2-4 招投标制度执行情况

经评价组核实，项目单位严格按照招投标及政府采购相关规定，委托山西金娣招标代理有限公司对该项目进行公开招标，确定运城市锐志电子科技有限公司为项目中标人，中标价 743.87 万元，供货期为合同签订后 30 天内，质保期 3 年，项目编号：1408272022AGK00053。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

B2-5 工程监理情况

经核实，在项目建设过程中，委托山西明兴信息工程监理有限公司作为项目监理单位，负责对智慧教育项目的设备到场、产品数量、

质量等进行检查、监督，确保工程按期、保质、保量完成；监理实施情况、工程质量情况、工程进度控制情况等资料完整。

满分 2 分，根据绩效评价指标，本指标得分 2 分，得分率 100%。

3. 产出类指标

产出类指标从校园广播及网络安装服务完成情况、校园安防监控安装服务完成情况、智慧教室设备安装服务完成情况、计算机教室设备安装服务完成情况、创客教室设备安装服务完成情况、录播设备安装服务完成情况、班班通设备安装服务完成情况、质量达标率、各系统设备综合使用率等 12 个方面对项目的产出情况进行评价，产出类指标分值 22 分，实际得分 20 分，得分率 90.91%。

表 3-4-1 项目产出类指标得分情况

二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率(%)
产出数量	C1-1 校园广播及网络安装服务完成情况	1	1	100
	C1-2 校园安防监控安装服务完成情况	1	1	100
	C1-3 智慧教室设备安装服务完成情况	1	1	100
	C1-4 计算机教室设备安装服务完成情况	1	1	100
	C1-5 创客教室设备安装服务完成情况	1	1	100
	C1-6 录播设备安装服务完成情况	1	1	100
	C1-7 班班通设备安装服务完成情况	1	1	100
产出质量	C2-1 项目验收有效性	4	4	100
产出时效	C3-1 项目完工及时性	6	4	66.67
产出成本	C4-1 项目成本可控性	5	5	100

C1-1 校园广播及网络安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完成校园广播及网络安装服务，具体为：安装 1 台 IP 网络广播系统主机、1 套 IP 网络广播主控软件、1 套网络广播移动分控软件、63 只网络解码音箱、3 只网络寻呼话筒、2 台数字定压功率放大器（插卡式）、107 只吸顶音箱、1 台核心交换机、118 台吸顶 AP、1 台 OLT、106 个网络机柜、3000 米六类网线等，用于支撑服务对象日常教学、管理、协同等工作。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C1-2 校园安防监控安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完成校园安防监控安装服务，具体为：安装 49 台全彩筒形摄像机、252 台半球摄像机、9 个网络机柜、6 台 64 路硬盘录像机、80 块监控硬盘、27 个壁挂机柜、7 台显示屏等。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C1-3 智慧教室设备安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完成智慧教室设备安装服务，具体为：

智慧教室安装包括智慧书法教室以及智慧阅览室。智慧书法教室主要安装 24 套书法临摹桌（2 人位）、48 套交互式数字临摹台、48 套学生互动拍摄系统、48 点高清同步传输系统、48 套学生镇尺以及学生毛笔、多功能墨盒、1 套书画教学展示台、1 套书法教学直播系统、1 套教室中控台案、1 套书画教学展示台等；智慧阅览室主要安装 1 套校园阅读系统、51 套电子墨水屏阅读器-学生版、51 套电子阅读器支架等。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C1-4 计算机教室设备安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完成计算机教室安装服务。具体为：安装 100 台学生电脑、50 张学生桌、102 个插线板、102 个椅子、2 台稳压器、6 台交换机、1 台高清录播主机、124 台教师电脑、10 台黑白激光打印机等。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C1-5 创客教室设备安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完成创客教室安装服务。具体为：安装 40 套智能硬件入门套装（初中版）、20 套创意机器人之智能车实验套装、20 套物联基础实验套装、20 套智能物流之智能搬运、2 套智慧物流套装等。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C1-6 录播设备安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完成录播设备安装服务。具体为：1 台安装高清录播主机、1 套录播管理软件、1 套录播导播软件、5 台高清摄像机、5 套高清摄像机管理软件、1 个教师定位分析仪、1 套教师定位分析软件、1 套学生定位分析软件、1 个学生定位分析仪、6 支采访话筒、1 套校园教学视频资源管理平台、36 台高清录播主机、36 套录播管理应用软件、72 台高清摄像机等。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C1-7 班班通设备安装服务完成情况

经评价组核实，运城市锐志电子科技有限公司已按照合同规定完

成班班通设备安装服务。具体为：安装 40 台教学设备、40 套左右推拉黑板、40 支教学智能笔、37.12 平米室内彩色 LED 屏、14.13 平米室内条屏、16.49 平米室外条屏、3.38 平米小会议室条屏、1 套控制终端等。

满分 1 分，根据绩效评价指标，本指标得分 1 分，得分率 100%。

C2-1 项目验收有效性

经评价组核实，2022 年 12 月 9 日，垣曲县城北初级中学组织与设备供应方运城市锐志电子科技有限公司进行项目验收工作，双方对设备数量、质量以及安装情况进行了验收，合格率 100%。

满分 4 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 100%。

C3-1 项目完工及时性

经评价组核实，根据合同规定，运城市锐志电子科技有限公司应在合同签订后 30 天内供货，合同签订日期为 2022 年 9 月 11 日，实际于 2022 年 12 月 9 日完成智慧教育项目全部供货内容，项目推迟将近两个月。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 4 分，得分率 66.67%。

C4-1 成本可控性

经评价组核实，项目预算评审后总投资 746.23 万元，中标价 743.87 万元，运城市锐志电子科技有限公司按照合同约定进行设备供应及安装，在实施过程中根据现场实际情况对部分品牌型号及参数进行变更，经双方协商一致后签订项目补充协议，核减合同金额 0.81 万元，最终实际总投资 743.06 万元，项目成本控制有效。

满分 5 分，根据绩效评价指标，本指标得分 5 分，得分率 100%。

4. 效益类指标

效益类指标从提升教学学习能力和效率、促进基础教育均衡化发展、未来教学发展需求性、学生满意度、教职工满意度 5 个方面对项目的效益情况进行评价，效益类指标分值 30 分，实际得分 28.90 分，得分率 96.33%。具体得分情况如下表所示：

表 3-5-1 项目效益类指标得分情况

二级指标	三级指标	标准分值	实际得分	得分率(%)
社会效益	D1-1 提升教学学习能力和效率	6	6	100
	D1-2 促进基础教育均衡化发展	6	6	100
可持续影响	D2-1 未来教学发展需求性	6	6	100
满意度	D3-1 学生满意度	6	5.47	91.17
	D3-2 教职工满意度	6	5.43	90.50

D1-1 提升教学学习能力和效率

垣曲县城北初级中学通过实施智慧校园项目，采购安装 40 间教室班班通设备、36 间教室常态录播设备、1 间教室精品录播设备以及覆盖全校的校园网络及安防监控设备。班班通设备改变了传统教师“板书”上课模式，使教师使用制作的课件教学，提高学生学习兴趣、加快教师上课节奏、使知识更富趣味性和对比性，同学间遇到无法解决的问题，可在网上查询，互相交流、集体参与、实现合作学习，更有效地获取知识；录播设备可满足常态化日常教学录制的需求，方便学生和教师观看直播、点播、课后自主学习、课后教学反思等；校园网络及安防监控设备，在有线网络的基础上，建设覆盖公共教学和活动区域的无线网及监控系统，形成安全稳定、可管可控的无线接入网络，为学校师生提供高速、便捷的互联网无线接入服务，为学生创造更加高效安全的学习环境，提升学校师生教学学习能力和效率。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

D1-2 促进基础教育均衡化发展

目前垣曲县存在着基础教育设施落后、多媒体教学设备老化、网络升级缓慢、平台应用困难、学习资源短缺、深度应用不足等问题，制约着教育信息化的发展。通过智慧校园建设，推动信息技术与教育教学的深度融合，在信息技术环境下，实现教育资源供给、教育精准管理、实现优质教育资源共享，打破优质教育资源不足的困局，促进教育均衡化发展。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

D2-1 未来教学发展需求性

随着信息技术的不断发展和普及，人们对于教育的需求也在不断提升。通过智慧校园建设项目，建设智能书法教室、创客教室、智慧阅览室、计算机教室，满足垣曲县城北初级中学对于个性化学习的需求，同时促进了学生的个性发展和创新能力，可有效满足未来教学发展需求。

满分 6 分，根据绩效评价指标，本指标得分 6 分，得分率 100%。

D3-1 学生满意度

项目组本次通过现场及网上发布电子调查问卷，共收回有效问卷 145 份，根据满意度调查问卷数据信息统计显示，5 个题目的总得分为 91.10 分，垣曲县城北初级中学学生满意度为 91.10%。

满意度评价内容	得分率 (%)
1. 您对项目在学校安全保障程度方面所起作用是否满意	90.69
2. 您对项目的信息化和智能化水平是否满意	90.17
3. 您对设备的使用稳定性及流畅性是否满意	92.24
4. 您对项目在帮助日常学习方面所起作用是否满意	90.69
5. 您对智慧校园建设项目实施后的整体效果是否满意	91.72
综合满意度	91.10

满分6分,根据绩效评价指标,本指标得分5.47分,得分率91.17%。

D3-2 教职工满意度

项目组本次通过现场及网上发布电子调查问卷,共收回有效问卷100份,根据满意度调查问卷数据信息统计显示,6个题目的总得分为90.53分,垣曲县城北初级中学教职工满意度为90.53%。

满意度评价内容	得分率(%)
1. 您对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用是否满意	90.79
2. 您对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用是否满意	91.05
3. 您对所购置的设备使用稳定性及流畅性是否满意	91.05
4. 您对项目在促进教育均衡方面所起作用是否满意	90.00
5. 您对项目在提高教师教学能力方面所起作用是否满意	90.53
6. 您对智慧校园建设项目实施后的整体效果是否满意	89.74
综合满意度	90.53

满分6分,根据绩效评价指标,本指标得分5.43分,得分率90.50%。

四、存在的问题及建议

(一)垣曲县城北初级中学绩效管理工作不到位,绩效指标不准确、不具体,可衡量性不强,自评报告内容描述不完整,具体为:

1.个别指标设置的指标内容及指标值不准确、不全面。如数量指标为:校园网络覆盖率达到100%,安防监控覆盖率达到100%,各功能室投入使用率为100%。其中“各功能室投入使用率为100%”应为质量指标,同时数量指标中也未具体描述设备购置数量,数量指标不准确、不全面,无法准确反映项目建设内容。

2.自评报告未对项目资金使用情况进行描述,未对项目绩效目标的完成及评价情况进行认真分析。

建议:垣曲县城北初级中学要加强绩效管理工作,完善预算绩效管理体系,把绩效目标作为编制预算不可或缺的有机内容。根据项目

具体实施情况制定切实可行的绩效目标，总体目标要贴近实际、符合项目特点，具体目标要充分考虑项目特点，合理制定项目产出、质量、时效性、经济效益、社会效益等目标，并以历史数据、行业标准及资金规模为依据，制定合理的绩效指标，年度终了及时开展项目自评，自评报告真实完整，便于财政部门通过绩效目标管理系统对项目进行绩效监督及管理工作。

（二）垣曲县城北初级中学未根据项目特点制定项目后续管理制度，项目缺乏制度制约，制度管理意识有待加强。

建议：项目单位应强化制度保障，结合项目具体情况制定项目后续管护制度，重视对购置设备的后期保养和维修管护，有效保障设备长期稳定运行。

（三）项目单位未按照合同规定时间完成，具体为：

根据合同规定，运城市锐志电子科技有限公司应在合同签订后30天内供货，合同签订日期为2022年9月11日，实际于2022年12月9日完成智慧教育项目全部供货内容，项目推迟将近两个月。

建议：项目单位需重视工程监督考核工作，高度重视项目推进工作，倒排工期、督促设备供给方及早进行设备安装，在保证质量的前提下尽早完成安装。工程建设过程中发现问题及时汇报，及时处理，确保工程能更加长期发挥作用。

附件 1:

财政支出项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价细则	得分
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合相关政策以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。符合得 0.4 分,否则不得分; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求。符合得 0.4 分,否则不得分; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需。符合得 0.4 分,否则不得分; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则。满足得 0.4 分,否则不得分。 ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。满足得 0.4 分,否则不得分。	2
				立项程序规范性	2	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立。满足得 0.5 分,否则不得分; ②审批文件、材料是否符合相关要求。满足得 0.5 分,否则不得分。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。满足得 1 分,否则不得分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价细则	得分
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	用以反映绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标或工作任务目标。绩效目标或工作目标全面合理得1分，否则不得分； ②绩效目标与实际工作内容密切相关。完全相关得1分，有1处不相关扣0.5分，扣完为止； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。完全符合得1分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量是否匹配。完全匹配得1分，有1处不匹配扣0.5分，扣完为止。	4
				绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。已划分为具体的绩效指标得1.5分，有1处不细化扣0.5分，扣完为止； ②绩效指标是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。绩效指标值清晰可衡量得1.5分，有1处不清晰不可衡量扣0.5分，扣完为止； ③绩效指标与项目目标任务数或计划数是否相对应。完全对应得1分，有1处不对应扣0.5分，扣完为止。	1
		资金投入	8	预算编制科学性	4	项目预算资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过可行性论证或会议讨论。经过论证或会议讨论得1分，否则不得分； ②预算内容与项目内容是否匹配。完全匹配	4

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价细则	得分
							得1分，有1处不匹配扣0.5分，扣完为止； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制。符合此项规定得1分，有1处不匹配扣0.5分，扣完为止； ④预算确定的项目投资额是否与工作任务相匹配。完全匹配得1分，有1处不匹配扣0.5分，扣完为止。	
				资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分。依据充分得2分，否则不得分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。合理得2分，否则不得分。	4
过程	28	资金管理	8	财政资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	根据财政实际到位资金占预算资金的比重计算得分（到位率=实际到位资金/预算资金*100%）。到位100%得2分，未达到100%，根据实际到位比例计算得分。	2
				预算执行率	2	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	根据项目实际支出资金占实际到位资金的比重计算得分（预算执行率=实际支出资金/实际到位资金*100%）。预算执行率100%，得2分，未达到100%，根据实际到位比例计算得分。	2
				资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合财务管理制度及有关资金管理规定的规定得1分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分；	4

地址：运城经济技术开发区库东路1号尚东SOHO楼1511室

电话：0359-2020283、2068977

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价细则	得分
							③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分，否则不得分；	
		组织实施	20	管理制度健全性	6	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	制定或具有财务和业务管理制度（如：招标投标制度、固定资产管理制度、设备管理制度、档案管理制度、后期管护制度等），且合法、合规、完整，得4分；每缺少一项，扣减1分，扣完为止。未制定相关制度，不得分。	4
	制度执行有效性			6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	在项目实施过程中，遵守相关管理规定得1分；项目调整及支出调整手续完备得1分；项目资料齐全并及时归档得1分（项目合同书、招投标资料、验收资料、预算结算资料等）；为保障项目顺利实施配备专门人员等条件落实到位得1分。	6	
	财政预算评审			4	考核是否履行财政评审手续。	按规定对财政投资建设项目履行财政评审手续的，得4分；反之不得分。	4	
	招投标制度执行情况			2	考核项目招投标制度执行情况。	项目建设单位按照规定对各项建设内容进行招投标，得2分；若发现1处未执行招投标制度，扣减0.2分，扣完为止。	2	
	工程监理情况			2	工程质量的监督和执行情况。	在项目建设过程中，聘请专业监理公司对工程质量进行监督且监理到位，得2分，反之不得分。	2	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价细则	得分
产出	22	产出数量	7	校园广播及网络安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的校园网络及广播安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目校园网络及广播安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
				校园安防监控安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的校园安防监控安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目校园安防监控安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
				智慧教室设备安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的智慧书法及智慧阅览教室设备安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目智慧书法及智慧阅览教室设备安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
				计算机教室设备安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的计算机教室设备安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目计算机教室设备安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
				创客教室设备安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的创客教室设备安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目创客教室设备安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
				录播设备安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的录播设备安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目录播设备安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
				班班通设备安装服务完成情况	1	考核运城市锐志电子科技有限公司所提供的班班通设备安装服务是否按照计划完成	锐志公司按照计划完成智慧校园项目班班通设备安装服务，得1分；未按照计划完成，分别扣减相应分值。	1
	产出质量	4	项目验收有效性	4	考核智慧校园项目安装设备达到使用要求的情况	项目建设完成后，设备验收达标率100%，得4分；未达到100%，根据实际达标率计算得分。	4	

地址：运城经济技术开发区库东路1号尚东SOHO楼1511室

电话：0359-2020283、2068977

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评价细则	得分
		产出时效	6	项目完工及时性	6	考核项目是否按照预计时间完成	智慧校园建设项目在预计时间内及时完工的，得6分；延期完成或未完成的，每延期一个月扣1分，扣完为止。	4
		产出成本	5	成本可控性	5	考核项目建设成本是否得到控制、是否超出预算或中标价	在正常的施工条件下，项目实际结算成本未超预算或中标价的，得5分；超出预算或中标价5%以下的，得3分，5%-10%的，得1分，10%以上的不得分。	5
效益	30	社会效益	12	提升教学学习能力和效率	6	项目实施在提升教学学习能力和效率方面所起的作用	项目实施后，在提高教学学校能力和效率方面起到积极作用的得3分；作用一般的得2分；作用不明显不得分。	6
				促进基础教育均衡化发展	6	项目实施在促进基础教育均衡化发展方面所起的作用	项目实施后，在促进基础教育均衡化发展方面起到积极作用的得3分；作用一般的得2分；作用不明显不得分。	6
		可持续影响	6	未来教学发展需求性	6	考察项目是否能满足未来教学发展需求	考核项目的前瞻性设计及配置情况，以及对于未来教学发展需求的满足程度，满足程度非常显著得5分，比较显著得3分；一般得1分。	6
		满意度	12	学生满意度	6	考核学生对智慧教育项目的满意程度	得分=有效调查问卷分数平均值×100%×4	5.47
				教职工满意度	6	考核教职工对智慧教育项目的满意程度	得分=有效调查问卷分数平均值×100%×4	5.43
合计	100		100		100			91.90

附件 2: 社会调查问卷汇总分析报告
垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目
绩效评价满意度调查

一、调查对象与调查内容

(一) 调查对象

本次调查对象分为两个，分别为垣曲县城北初级中学学生、垣曲县城北初级中学教职工。

(二) 调查内容

根据调查对象不同，分别设置不同的调查问卷，调查问卷内容包括：

1. 垣曲县城北初级中学学生

共分 5 个方面内容向垣曲县城北初级中学学生发放调查问卷，分别为：对项目在学校安全保障程度方面所起作用，对项目的信息化和智能化水平，对设备的使用稳定性及流畅性，对项目在帮助日常学习方面所起作用，对智慧校园建设项目实施后的整体效果。

2. 垣曲县城北初级中学教职工

共分 6 个方面内容向垣曲县城北初级中学教职工发放调查问卷，分别为：对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用，对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用，对所购置的设备使用稳定性及流畅性，对项目在促进教育均衡方面所起作用，对项目在提高教师教学能力方面所起作用，对智慧校园建设项目实施后的整体效果。

二、调查方法与调查方式

(一) 调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在问卷调查全面开展之前，先

对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和问卷方案进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方式

本次调查工作人员采用现场及网上电子问卷方式。其中：垣曲县城北初级中学学生调查问卷收回 145 份；垣曲县城北初级中学教职工调查问卷收回 95 份。

（三）调研安排

根据项目进度安排，评价组于 2023 年 12 月对调查对象开展问卷调查并分析。

三、调查问卷的评价方法

调查问卷分别设置了 5-6 个客观题，总分为 100 分。客观题各选项的评分值：选项非常满意（A）为 100%，选项满意（B）为 75%，选项一般（C）为 50%，选项不满意（D）为 0%。根据收回调查问卷数量，分别统计客观题选项 A、B、C、D 各自选择百分比，按客观题 A、B、C、D 选择百分比乘以各选项评分值得出各客观题加权平均满意度得分，然后计算出客观题算术平均数，将其作为满意度调查问卷最终得分。

四、调查问卷的分析

（一）垣曲县城北初级中学学生调查问卷分析

1. 被调查对象代表性分析

（1）基本情况

被调查的对象为垣曲县城北初级中学学生，采取现场及网上电子问卷方式。

（2）样本回收率、有效问卷率

本次回收 145 份，有效问卷 145 份。

2. 基本问题分析

(1) 您对项目在学校安全保障程度方面所起作用是否满意

根据调查问卷结果显示，71.72%的受访者对项目在学校安全保障程度方面所起作用非常满意，19.31%的受访者对项目在学校安全保障程度方面所起作用比较满意，8.97%受访者对项目在学校安全保障程度方面所起作用满意度一般。分析得出，受访者对项目在学校安全保障程度方面所起作用非常满意。

(2) 您对项目的信息化和智能化水平是否满意

根据调查问卷结果显示，71.03%的受访者对项目的信息化和智能化水平非常满意，18.62%的受访者对项目的信息化和智能化水平比较满意，10.35%受访者对项目的信息化和智能化水平满意度一般。分析得出，受访者对项目的信息化和智能化水平非常满意。

(3) 您对设备的使用稳定性及流畅性是否满意

根据调查问卷结果显示，74.48%的受访者对设备的使用稳定性及流畅性非常满意，20%的受访者对设备的使用稳定性及流畅性比较满意，5.52%受访者对设备的使用稳定性及流畅性满意度一般。分析得出，受访者设备的使用稳定性及流畅性非常满意。

(4) 您对项目在帮助日常学习方面所起作用是否满意

根据调查问卷结果显示，73.10%的受访者对项目在帮助日常学习方面所起作用非常满意，16.55%的受访者对项目在帮助日常学习方面所起作用比较满意，10.35%受访者对项目在帮助日常学习方面所起作用满意度一般。分析得出，受访者对项目在帮助日常学习方面所起作用非常满意。

(5) 您对智慧校园建设项目实施后的整体效果是否满意

根据调查问卷结果显示，76.55%的受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果非常满意，13.79%的受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果比较满意，9.66%受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果满意度一般。分析得出，受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果非常满意。

3. 满意度分析

本次调查采用电子问卷方式，收回有效问卷 145 份，综合得分为 91.10 分，具体满意度分项得分见附表：

附表 满意度分项得分情况

满意度评价内容	得分率 (%)
2. 您对项目在提升学校安全保障程度方面所起作用是否满意	90.69
2. 您对项目的信息化和智能化水平是否满意	90.17
3. 您对项目实施后设备的使用稳定性及流畅性是否满意	92.24
4. 您对项目在帮助日常学习方面所起作用是否满意	90.69
5. 您对智慧校园建设项目实施后的整体效果是否满意	91.72
综合满意度	91.10

(二) 垣曲县城北初级中学教职工调查问卷分析

1. 被调查对象代表性分析

(1) 基本情况

被调查的对象为垣曲县城北初级中学教职工，采取现场及网上电子问卷方式。

(2) 样本回收率、有效问卷率

本次回收 95 份，有效问卷 95 份。

2. 基本问题分析

(1) 您对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用是否满意

根据调查问卷结果显示，72.63%的受访者对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用非常满意，17.90%的受访者对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用比较满意，9.47%受访者对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用满意度一般。分析得出，受访者对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用非常满意。

(2) 您对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用是否满意

根据调查问卷结果显示，73.69%的受访者对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用非常满意，16.84%的受访者对促进教育信息化和学校管理智能化水平所起作用比较满意，9.47%受访者对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用满意度一般。分析得出，受访者对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用非常满意。

(3) 您对所购置的设备使用稳定性及流畅性是否满意

根据调查问卷结果显示，72.63%的受访者对所购置的设备使用稳定性及流畅性非常满意，18.95%的受访者对所购置的设备使用稳定性及流畅性比较满意，8.42%受访者对所购置的设备使用稳定性及流畅性满意度一般。分析得出，受访者对所购置的设备使用稳定性及流畅性非常满意。

(4) 您对项目在促进教育均衡方面所起作用是否满意

根据调查问卷结果显示，72.63%的受访者对项目在促进教育均衡方面所起作用非常满意，14.74%的受访者对项目在促进教育均衡方面所起作用比较满意，12.63%受访者对项目在促进教育均衡方面所起作用满意度一般。分析得出，受访者对项目在促进教育均衡方面所起作用非常满意。

(5) 您对项目在提高教师教学能力方面所起作用是否满意

根据调查问卷结果显示，70.53%的受访者对项目在提高教师教学能力方面所起作用非常满意，21.05%的受访者对项目在提高教师教学能力方面所起作用比较满意，8.42%受访者对项目在提高教师教学能力方面所起作用满意度一般。分析得出，受访者对项目在提高教师教学能力方面所起作用非常满意。

(6) 您对智慧校园建设项目实施后的整体效果是否满意

根据调查问卷结果显示，67.37%的受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果非常满意，24.21%的受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果比较满意，8.42%受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果满意度一般。分析得出，受访者对智慧校园建设项目实施后的整体效果非常满意。

3. 满意度分析

本次调查采用电子问卷方式，收回有效问卷 95 份，综合得分为 90.53 分，具体满意度分项得分见附表：

附表 满意度分项得分情况

满意度评价内容	得分率 (%)
1. 您对项目在提升校园网络安全保障程度方面所起作用是否满意	90.79
2. 您对项目在促进教育信息化和学校管理智能化水平方面所起作用是否满意	91.05
3. 您对所购置的设备使用稳定性及流畅性是否满意	91.05
4. 您对项目在促进教育均衡方面所起作用是否满意	90.00
7. 您对项目在提高教师教学能力方面所起作用是否满意	90.53
8. 您对智慧校园建设项目实施后的整体效果是否满意	89.74
综合满意度	90.53

附件 3: 项目自评报告评价

一、项目基本情况

1. 项目实施情况

为全面提高垣曲县教育信息化水平，根据教育部《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6 号）、《网络学习空间建设与应用指南》（教技〔2018〕4 号）、《中小学数字校园规范（试行）》（教技〔2018〕5 号）、《运城市智慧教育二期工程建设实施方案》（运政智〔2019〕1 号）等文件精神，决定实施垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目，改善学校教育信息化基础设施，优化教育教学环境，满足基本教学办学需求，深入推进信息技术深度应用，大力提高学校教育现代化水平。

2. 财政资金使用情况

（1）项目资金来源

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目总投资 743.06 万元，项目资金由垣曲县财政统筹解决。

（2）项目资金使用情况

截止绩效评价基准日，该项目已使用财政资金 743.06 万元，资金已全部支付，用于购置校园网络、安防监控、校园广播以及 41 间教室信息化教学设备。

二、项目绩效目标

1. 总体目标

形成与我校教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，高速互联的基础网络普及完善，资源平台和管理平台功能齐全，智能安全的信息技术应用环境全面建成。依托智能平台技术，推动信息技术与教育教学的深

度融合，促进教育结构优化、教育公平实现和教育质量提高。

2. 项目分解指标

(1) 产出指标

数量指标：校园网络覆盖率 100%，安防监控覆盖率 100%，各功能室投入使用率 100%；

质量指标：设备质量合格率 100%；

时效指标：智慧校园建设期 \leq 1 年；

成本指标：校园网络系统 \leq 100 万，安防广播系统 \leq 200 万，各功能室及设备 \leq 443.06 万；

(2) 效益指标

社会效益指标：学生长期受到教育；

可持续影响指标：智慧校园项目 \geq 8 年；

(3) 满意度指标

服务对象满意度指标：师生满意度 \geq 93%。

三、自评报告评价

垣曲县城北初级中学绩效管理工作不到位，绩效指标不准确、不具体，可衡量性不强，具体为：数量指标：校园网络覆盖率达到 100%，安防监控覆盖率达到 100%，各功能室投入使用率为 100%。其中“各功能室投入使用率为 100%”应为质量指标，同时数量指标中也未具体描述设备购置数量，数量指标不准确、不全面，无法准确反映项目建设内容。

项目单位根据项目实施情况编制项目自评报告，自评报告详细描述项目的实施内容，但未对项目资金使用情况进行描述，未对项目绩效目标的完成及评价情况进行认真分析。

附件 4 访谈报告

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目

访谈报告

尊敬的领导：

您好！我们接受垣曲县财政局委托，为更好的开展垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目的绩效评价工作，获取该项目的基本工作内容与情况，了解垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目的实际情况和想法思路，现对该项目进行详细访谈。感谢您的支持！

（一）访谈对象

本次绩效评价访谈对象包括：城北初级中学智慧校园项目负责人

（二）访谈内容

1、请您简述一下垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目立项背景

为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依据《教育信息化2.0行动计划》，推进教育信息化融合创新发展，实现教育理念与模式、教学内容与方法的改革创新，形成支撑和引领教育现代化的新途径和新模式，打造纵向衔接、横向贯通，全方位、多层次、立体化的教育新格局，构建网络化、数字化、智能化、个性化、终身化的教育体系，促进教育公平、提高教育质量，推动智慧教育整体水平走在全国前列。

为全面提高垣曲县教育信息化水平，根据教育部《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）、《网络学习空间建设与应用指南》（教技〔2018〕4号）、《中小学数字校园规范（试行）》（教技〔2018〕5号）、《运城市智慧教育二期工程建设实施方案》（运政智〔2019〕1号）等文

件精神，决定实施垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目，改善学校教育信息化基础设施，优化教育教学环境，满足基本教学办学需求，深入推进信息技术深度应用，大力提高学校教育现代化水平。

2、请您简述一下 2022 年项目具体实施情况

项目建设内容包括：校园广播、安防监控、校园网络、班班通设备、智慧书法教室、智慧阅览室、计算机教室、精品录播、创客教室、常态录播等建设工作。

主要设备及系统包括：IP 网络广播系统主机、IP 网络广播主控软件、网络广播移动分控软件、广播管理系统主机、监听网络解码音箱、网络寻呼话筒、控制电脑、核心交换机、广播机柜、纯后级定压功率放大器(插卡式)、无线手持话筒、全彩筒型摄像机、半球摄像机、8 口 POE 交换机、16 口 POE 交换机、24 口 POE 交换机、64 路硬盘录像机、吸顶 AP、户外 AP、教学设备、OLT、交互式数字临摹台、学生互动拍摄系统、书法临摹桌、书法教学直播系统、书法教学查询系统、书法集创系统、书画教学展示台等。

3、您认为项目的主要运行成效有哪些

通过项目实施，扩大优质教育资源覆盖面、推进“双减”政策落实落细、推进义务教育优质均衡创建、促进各类教育协调均衡发展、推动中华优秀传统文化进校园及确保校园安全。

4、请您简述一下该项目在实施过程中存在的问题及需要改进的地方

(1) 存在的问题

垣曲县城北初级中学未根据项目特点制定项目后续管理制度等，项目缺乏制度制约，制度管理意识有待加强。

(2) 改进措施

项目单位应强化制度保障，结合项目具体情况制定项目后续管护制度，重视对购置设备的后期保养和维修管护，有效保障设备长期稳定运行。

附件5 合规性检查报告

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目 合规性检查报告

本次合规性检查内容包括财政资金拨付及使用、财务管理、业务管理等，目的在于深入了解垣曲县城北初级中学智慧校园建设经费运行、使用和监管等方面的开展情况，以发现项目和管理层面和实施操作规范性上存在的问题，内容如下：

一、项目资金来源

垣曲县城北初级中学智慧校园建设项目总投资 743.06 万元，项目资金由垣曲县财政统筹解决。

二、项目资金使用情况

截止绩效评价基准日，该项目已使用财政资金 743.06 万元，资金已全部支付，用于购置校园网络、安防监控、校园广播以及 41 间教室信息化教学设备。

三、项目资金合规性检查方法

本次合规性检查通过对垣曲县城北初级中学提供的资料进行整理，采用现场核查、访谈、询问等方式开展工作。现场检查内容包括：项目单位的有关规章制度、项目总结报告、会计凭证、明细账等。

四、检查结果

（一）资金拨付及使用

经评价组核实，项目单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度资金规定的用途，未发现擅自变动、挪用项目资金的行为。

同时，项目单位在拨付项目资金时，严格按照本单位制定的财务管理

制度及流程执行，资金拨付审批程序和手续完整。

（二）财务管理

项目实施单位为了规范资金的管理与使用，制定了相应的财务管理制度，有健全的财务管理制度，依照该制度、办法对财务进行管理，管理基本合规。

（三）业务管理


垣曲县城北初级中学制定了设施设备使用维修制度、固定资产管理制度以及财物预算结算制度《上报、审批、签字、工程计划》，但未制定项目后续管理制度，项目缺乏制度制约，制度管理意识有待加强。

五、检查结论

通过对项目涉及的财务管理和项目管理等方面核查，财务管理制度健全，但未制定项目后续管理制度，项目缺乏制度制约。

附件 6: 现场照片



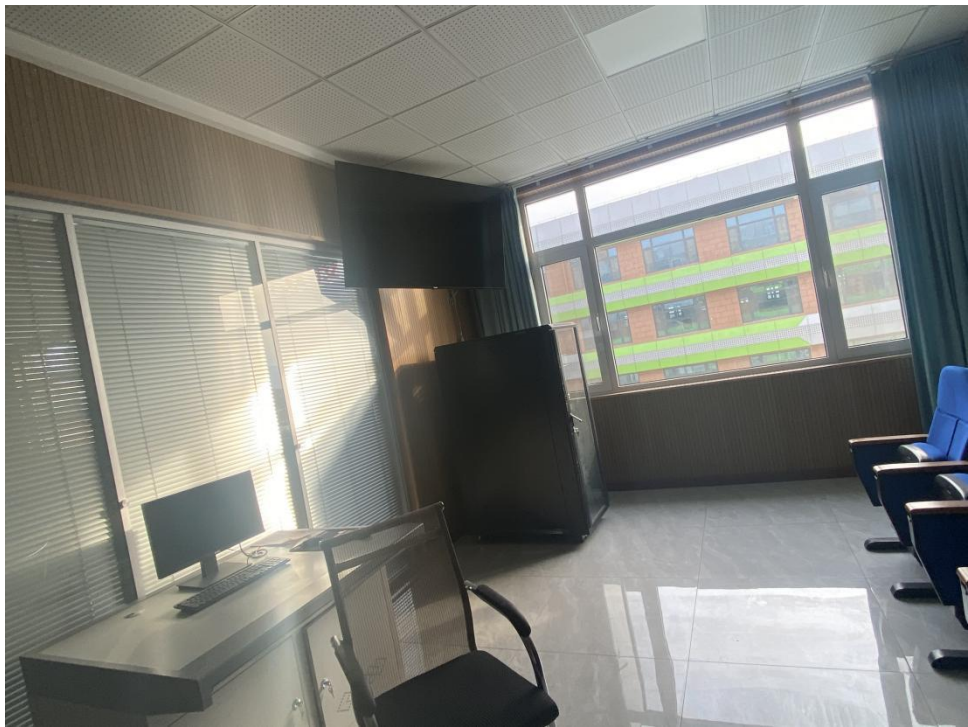







地址：运城经济技术开发区库东路1号尚东SOHO楼1511室

电话：0359-2020283、2068977







